

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$	128.456,81	% ADITADO	5,80%
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO	0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	2.341.761,32	% TOTAL	5,80%
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <td colspan="2">% ACUMULADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			PROCESSO:		Nº 025/2023	% ACUMULADO					
PERÍODO:		02/02/2024	ENDERÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			VALOR DO CONTRATO:		R\$	2.213.304,51	% DESTE BDI				
SINAP PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SEIRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td>14/03/2024</td> <td colspan="2">EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)</td> <td></td> <td colspan="2">MEDIO NO PERÍODO:</td> <td>R\$</td> <td>16.578,97</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td>		14/03/2024	EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			MEDIO NO PERÍODO:		R\$	16.578,97					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
				UNID.	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2		R\$ 376,52	6,00	6,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.259,12	R\$ 2.259,12	R\$ -
1.2	Composições Próprias	COT-0002-PMISM	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO MURIBARA)	MÊS		R\$ 560,38	12,00	3,00	0,00%	25,00%	75,00%	R\$ 6.724,56	R\$ 1.681,14	R\$ 5.043,42
2			RUAS DIÁRIAS DA FOMTE											
2.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES											
2.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMISM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M		R\$ 14,15	53,00	53,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 749,95	R\$ 749,95	R\$ -
2.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMISM	DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2		R\$ 30,96	17,00	17,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 526,32	R\$ 526,32	R\$ -
2.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMISM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND		R\$ 116,59	17,00	17,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.982,03	R\$ 1.982,03	R\$ -
2.2			MOVIMENTO DE TERRA											
2.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2		R\$ 3,22	998,83	998,72	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 3.216,23	R\$ 3.215,87	R\$ 0,35
2.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMISM	CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³		R\$ 6,89	249,70	249,68	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.720,43	R\$ 1.720,29	R\$ 0,13
2.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		R\$ 2,96	1.498,24	1.498,08	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 4.434,79	R\$ 4.434,31	R\$ 0,47
2.3			PAVIMENTAÇÃO											
2.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		R\$ 202,22	106,25	106,25	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 21.485,87	R\$ 21.485,87	R\$ -
2.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2		R\$ 103,99	885,53	885,46	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 92.086,26	R\$ 92.078,98	R\$ 7,27
2.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		R\$ 71,50	393,29	393,25	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 28.120,23	R\$ 28.117,37	R\$ 2,86
2.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMISM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m		R\$ 58,45	62,25	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.638,51	R\$ -	R\$ 3.638,51
2.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M		R\$ 51,58	393,29	393,25	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 20.285,89	R\$ 20.283,83	R\$ 2,06
2.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		R\$ 2,96	3.243,00	3.187,50	0,00%	98,00%	1,00%	R\$ 9.599,28	R\$ 9.435,00	R\$ 164,28
2.4			URBANIZAÇÃO											
2.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		R\$ 99,38	17,69	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.758,03	R\$ -	R\$ 1.758,03
2.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3		R\$ 704,45	5,89	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.149,21	R\$ -	R\$ 4.149,21
2.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMISM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2		R\$ 143,25	117,98	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 16.900,63	R\$ -	R\$ 16.900,63
2.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2		R\$ 8,32	78,65	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 654,36	R\$ -	R\$ 654,36
2.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2		R\$ 52,33	78,65	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.115,75	R\$ -	R\$ 4.115,75
2.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3		R\$ 93,00	98,83	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.191,19	R\$ -	R\$ 9.191,19
2.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3		R\$ 850,64	32,93	32,93	59,00%	100,00%	0,00%	R\$ 28.011,57	R\$ 16.578,97	R\$ -
2.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2		R\$ 160,99	19,92	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.206,92	R\$ -	R\$ 3.206,92

José Severino da Silva
 Tecnólogo em Construção Civil e Edificações
 Registro: 18113502411
 Responsável ou Representante Técnico
 Empresa Contratada

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura

Djalison Pereira de Oliveira
 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 CRT-PE: 181613657-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	% ADITADO		5,80%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	CONCORRÊNCIA: 013/2023 <th colspan="2">ADITIVO DE SUPRESSÃO:</th> <td></td> <th colspan="2">% SUPRIMIDO</th> <td>0,00%</td>		ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	Nº 032/2023 <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO ADITADO</th> <td>R\$</td> <th colspan="2">% TOTAL</th> <td>5,80%</td>		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	% TOTAL		5,80%			
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">Nº 025/2023 <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO <td>R\$</td> <th colspan="2">% ACUMULADO</th> <td>64,76%</td> </th></th>			Nº 025/2023 <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO <td>R\$</td> <th colspan="2">% ACUMULADO</th> <td>64,76%</td> </th>		VALOR DO CONTRATO <td>R\$</td> <th colspan="2">% ACUMULADO</th> <td>64,76%</td>		R\$	% ACUMULADO		64,76%			
PERÍODO:		02/02/2024 - 14/03/2024	ENDEREÇO:		SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	R\$ <th colspan="2">% DESTES BIM</th> <td></td> <th colspan="2">% DESTE BIM</th> <td>0,75%</td>		% DESTES BIM			% DESTE BIM		0,75%			
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SK RO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. <td></td> <th colspan="2">EMPREENHIMENTO:</th> <td>Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)</td> <th colspan="2">R\$ <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <td></td> <th colspan="2">FÍSICO</th> <td></td> </th>			EMPREENHIMENTO:		Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	R\$ <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <td></td> <th colspan="2">FÍSICO</th> <td></td>		QUANTITATIVO			FÍSICO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
2.5			SINALIZAÇÃO													
2.5.1	Composições Próprias	CP-7916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$	222,86	R\$
2.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	393,29	-	392,05	1,24	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 752,11	R\$	752,11	R\$
2.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	26,40	-	13,20	13,20	0,00%	50,00%	50,00%	R\$ 8.783,80	R\$	4.391,90	R\$
2.5.4	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	82,09	-	41,05	41,04	0,00%	50,00%	49,00%	R\$ 1.317,54	R\$	658,85	R\$
2.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	26,40	-	13,20	13,20	0,00%	49,00%	49,00%	R\$ 762,69	R\$	381,34	R\$
2.6			DRENAGEM													
2.6.1	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	22,00	-	13,00	9,00	0,00%	59,00%	40,00%	R\$ 5.800,08	R\$	3.427,32	R\$
2.6.2	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 76,68	380,00	-	260,40	119,60	0,00%	68,00%	31,00%	R\$ 29.138,40	R\$	19.967,47	R\$
3			RUA ELUGÊNIO CARDOSO DA FONTE													
3.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES													
3.1.1	Composições Próprias	CP-S00021-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	41,00	-	40,80	0,20	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 580,15	R\$	577,32	R\$
3.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 30,96	13,00	-	13,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 402,48	R\$	402,48	R\$
3.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	19,00	-	19,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.215,21	R\$	2.215,21	R\$
3.2			MOVIMENTO DE TERRA													
3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	959,40	-	959,40	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.024,86	R\$	3.024,86	R\$
3.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	179,91	-	179,89	0,02	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.239,57	R\$	1.239,44	R\$
3.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	1.409,10	-	1.409,10	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.170,93	R\$	4.170,93	R\$
3.3			PAVIMENTAÇÃO													
3.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	121,75	-	121,75	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 24.620,28	R\$	24.620,28	R\$
3.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	753,34	-	753,34	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 78.339,82	R\$	78.339,82	R\$
3.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	348,81	-	348,80	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 24.939,91	R\$	24.939,20	R\$
3.3.4	Composições Próprias	CP-S02622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 58,45	43,99	-	18,50	25,49	0,00%	42,00%	57,00%	R\$ 2.571,21	R\$	1.081,32	R\$
3.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	348,81	-	335,20	13,61	0,00%	96,00%	3,00%	R\$ 17.991,61	R\$	17.289,61	R\$
3.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	4.217,10	-	4.216,80	0,30	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 12.482,61	R\$	12.481,72	R\$
3.3.7	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	R\$ 8,55	94,05	-	-	94,05	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 804,12	R\$	-	R\$
3.3.8	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 126,51	62,70	-	-	62,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.932,17	R\$	-	R\$

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
Civil - Matrícula nº 811370
Responsável Técnico
Registro nº 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

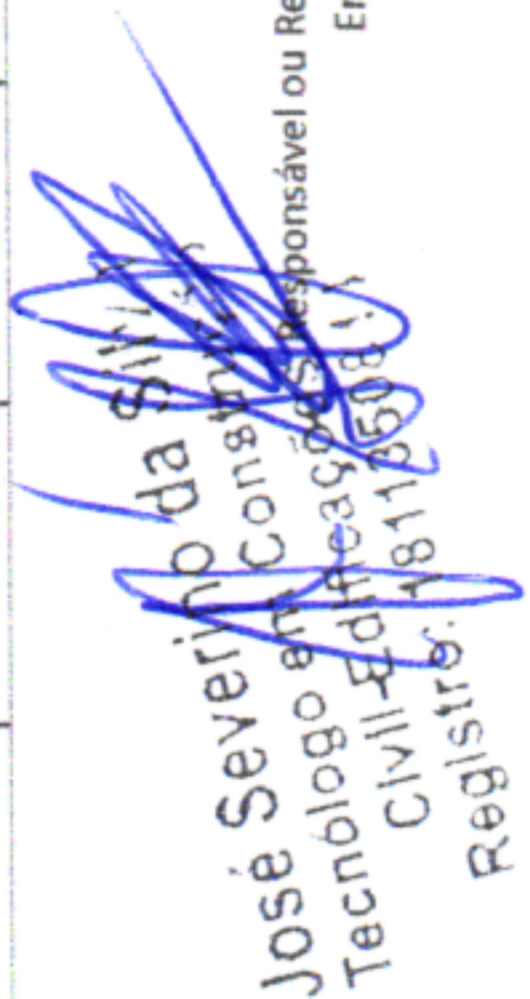
BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

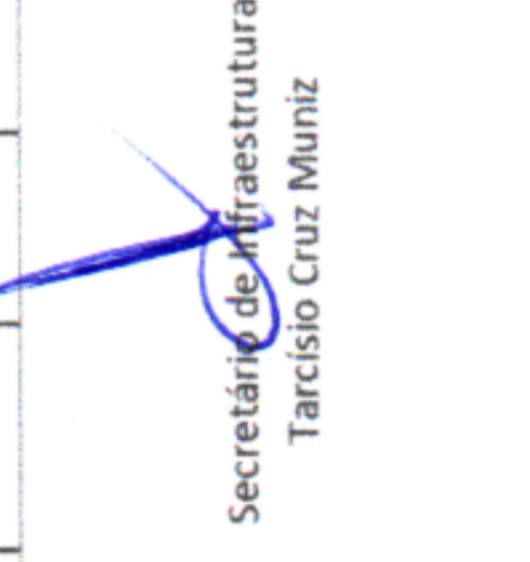
INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	128.456,81	% ADITADO		5,80%			
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA <td colspan="2">CONCORRÊNCIA: 013/2023</td> <th colspan="2">ADITIVO DE SUPRESSÃO:</th> <td></td> <td></td> <th colspan="2">% SUPRIMIDO</th> <td>0,00%</td>		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS <td colspan="2">NF 052/2023</td> <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO ADITADO</th> <td>R\$</td> <td>2.341.761,32</td> <th colspan="2">% TOTAL</th> <td>5,80%</td>		NF 052/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	2.341.761,32	% TOTAL		5,80%			
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATO:		NF 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$	2.213.304,51	% ACUMULADO		64,76%			
PERÍODO:		02/02/2024 - 14/03/2024	MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	16.578,97	% DESTA B.M				% ACUMULADO		0,75%			
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SE RO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE LISTOS <td></td> <th colspan="2">EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <td></td> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <td></td> </th>			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <td></td> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <td></td>				QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO					
ITEM	UNID.	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
URBANIZAÇÃO																
3.4	M3	R\$	99,38	15,68	-	-	15,68	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	60.317,18	R\$	32.152,48	R\$	28.164,70
3.4.1	M3	R\$	704,45	5,22	-	-	5,22	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.558,27	R\$	-	R\$	1.558,27
3.4.2	M2	R\$	143,25	104,64	-	-	104,64	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.677,22	R\$	-	R\$	3.677,22
3.4.3	M2	R\$	8,32	69,75	-	-	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	14.989,68	R\$	-	R\$	14.989,68
3.4.4	M2	R\$	52,33	69,75	-	-	69,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	580,32	R\$	-	R\$	580,32
3.4.5	M3	R\$	93,00	85,32	-	-	85,32	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.650,01	R\$	-	R\$	3.650,01
3.4.6	M3	R\$	850,64	28,47	-	-	28,47	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	7.934,76	R\$	-	R\$	7.934,76
3.4.7	M2	R\$	160,99	23,04	-	-	23,04	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	24.217,72	R\$	-	R\$	24.217,72
3.4.8	M2	R\$	111,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.709,20	R\$	-	R\$	3.709,20
3.5	M	R\$	1,92	342,80	-	-	342,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	9.029,09	R\$	-	R\$	9.029,09
3.5.1	M	R\$	11,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	222,86	R\$	-	R\$	222,86
3.5.2	M	R\$	332,72	19,80	-	-	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	658,17	R\$	-	R\$	658,17
3.5.3	M	R\$	16,05	61,57	-	-	61,57	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	6.587,85	R\$	-	R\$	6.587,85
3.5.4	M2	R\$	28,89	19,80	-	-	19,80	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	988,19	R\$	-	R\$	988,19
3.5.5	M2	R\$	263,64	22,00	-	-	22,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	572,02	R\$	-	R\$	572,02
3.6	M	R\$	76,68	340,00	-	-	340,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	31.871,28	R\$	-	R\$	31.871,28
3.6.1	M	R\$	263,64	22,00	-	-	22,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	5.800,08	R\$	-	R\$	5.800,08
3.6.2	M	R\$	76,68	340,00	-	-	340,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	26.071,20	R\$	-	R\$	26.071,20
4	M	R\$	295,211,98	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23,00%	R\$	295.211,98	R\$	265.160,04	R\$	30.051,90
4.1	M	R\$	10,226,11	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	10.226,11	R\$	10.226,11	R\$	1,13
4.1.1	M	R\$	14,15	336,68	-	-	336,68	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	4.764,02	R\$	4.764,02	R\$	1,13
4.1.2	M2	R\$	30,96	135,00	-	-	135,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	4.179,60	R\$	4.179,60	R\$	-
4.1.3	UND	R\$	116,59	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.282,49	R\$	1.282,49	R\$	-
4.2	M2	R\$	3,22	1.035,20	-	-	1.034,83	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	9.712,75	R\$	9.709,32	R\$	3,43
4.2.1	M2	R\$	6,89	258,80	-	-	258,71	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	3.333,34	R\$	3.332,15	R\$	1,19
4.2.2	M3XKM	R\$	2,96	1.552,80	-	-	1.552,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.783,13	R\$	1.782,51	R\$	0,62
4.3	M3	R\$	202,22	112,09	-	-	112,09	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	4.596,28	R\$	4.594,66	R\$	1,62
4.3.1	M2	R\$	103,99	934,20	-	-	934,07	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	174.142,83	R\$	173.353,03	R\$	789,77
4.3.2	M2	R\$	103,99	934,20	-	-	934,07	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	22.666,83	R\$	22.666,83	R\$	-
4.3.2	M2	R\$	103,99	934,20	-	-	934,07	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	97.147,45	R\$	97.147,45	R\$	13,51

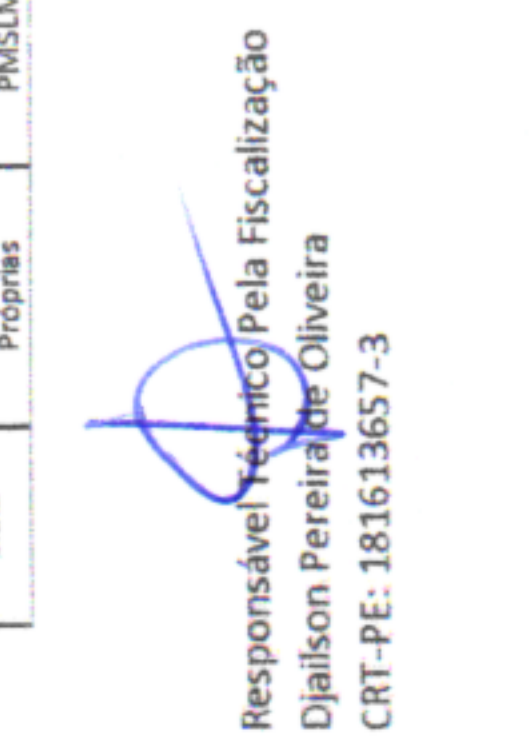


BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$	% ADITADO		128.456,81	% SUPRIMIDO		5,80%	SALDO		R\$	0,71	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO		0,00%	% TOTAL		5,80%	SALDO		R\$	775,04	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	% TOTAL		2.341.761,32				SALDO		R\$	0,51	
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO:</th> <td>R\$</td> <th colspan="2">% ACUMULADO</th> <td>64,76%</td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2">SALDO</th> <td>R\$</td> <td>25.750,69</td>			PROCESSO:		Nº 025/2023	VALOR DO CONTRATO:		R\$	% ACUMULADO		64,76%				SALDO		R\$	25.750,69	
PERÍODO:		02/02/2024	ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE <td></td> <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO:</th> <td>R\$</td> <th colspan="2">MEDIDO NO PERÍODO:</th> <td>R\$</td> <th colspan="2">% DESTA BIM</th> <td>0,75%</td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2">SALDO</th> <td>R\$</td> <td>574,57</td>			VALOR DO CONTRATO:		R\$	MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	% DESTA BIM		0,75%				SALDO		R\$	574,57	
SINAPI Nº 09/2023 - NÃO DESONERADA, SEM 07/2023 - NÃO DESONERADA, ONSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td></td> <th colspan="2">EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <th colspan="2">BDI</th> <td>20,97%</td> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </th>			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <th colspan="2">BDI</th> <td>20,97%</td> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			BDI		20,97%	QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO						
4.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	345,36	-	345,35	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 24.693,24	R\$	24.692,52	R\$						
4.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 58,45	31,96	-	18,70	13,26	0,00%	58,00%	41,00%	R\$ 1.868,06	R\$	1.093,01	R\$						
4.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	345,36	-	345,33	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 17.813,66	R\$	17.813,15	R\$						
4.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	3.362,70	-	3.362,70	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.953,59	R\$	9.953,59	R\$						
4.4			URBANIZAÇÃO																			
4.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	15,53	-	15,53	15,53	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.543,37	R\$	-	R\$						
4.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	5,17	-	5,17	5,17	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.642,00	R\$	-	R\$						
4.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	103,60	-	103,60	103,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.840,70	R\$	-	R\$						
4.4.4	SINAPI	87895	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	69,06	-	69,06	69,06	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 574,57	R\$	-	R\$						
4.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	57,56	-	57,56	57,56	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.012,11	R\$	-	R\$						
4.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	94,25	-	94,25	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.765,25	R\$	8.765,25	R\$						
4.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 850,64	31,42	-	31,42	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 26.727,10	R\$	26.727,10	R\$						
4.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	13,28	-	13,28	13,28	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.137,94	R\$	-	R\$						
4.5			SINALIZAÇÃO																			
4.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$	222,86	R\$						
4.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	345,36	-	345,36	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 663,09	R\$	663,09	R\$						
4.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	19,80	-	13,20	6,60	0,00%	66,00%	33,00%	R\$ 6.587,85	R\$	4.391,90	R\$						
4.5.4	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	61,57	-	41,05	20,52	0,00%	66,00%	33,00%	R\$ 988,19	R\$	658,85	R\$						
4.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	19,80	-	13,20	6,60	0,00%	66,00%	33,00%	R\$ 572,02	R\$	381,34	R\$						
4.6			DRENAGEM																			
4.6.1	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 76,68	333,60	-	333,60	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 25.580,44	R\$	25.580,44	R\$						
4.6.2	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	20,00	-	17,00	3,00	0,00%	85,00%	15,00%	R\$ 5.272,80	R\$	4.481,88	R\$						
5			RUA LEOPOLDINA BARDEIRA																			
5.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES																			
5.1.1	Composições Próprias	CP-S00021-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	43,00	-	43,00	43,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 608,45	R\$	-	R\$						
5.1.2	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	6,00	-	6,00	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 699,54	R\$	-	R\$						
5.2			MOVIMENTO DE TERRA																			
5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	1.976,24	-	1.976,24	1.976,24	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.363,49	R\$	-	R\$						
5.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	494,06	-	494,06	494,06	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.404,07	R\$	-	R\$						


 José Severino da Silva
 Tecnólogo em Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural
 Civil - Ed. Reações - Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada
 Registro: 18116567-3


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz


 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$		1.28.456,81		% ADITADO		5,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		0,00%		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		2.341.761,32		% TOTAL		5,80%	
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		% ACUMULADO		R\$		64,76%					
PERÍODO:		02/02/2024 - 14/03/2024		ENDEREO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% DESTA BM		R\$		0,75%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO									
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO				
5.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.964,36	-	2.964,36	0,00%	100,00%	R\$	8.774,50	R\$	8.774,50						
5.3	SINAPI	96396	PAVIMENTAÇÃO	M3	209,42	-	209,42	0,00%	100,00%	R\$	314.733,98	R\$	314.733,98						
5.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.745,22	-	1.745,22	0,00%	100,00%	R\$	42.348,91	R\$	42.348,91						
5.3.2	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	541,74	-	541,74	0,00%	100,00%	R\$	181.485,42	R\$	181.485,42						
5.3.3	SINAPI	CP-50262-PMSLM	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	96,25	-	96,25	0,00%	100,00%	R\$	5.625,81	R\$	5.625,81						
5.3.4	SINAPI	94287	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	541,74	-	541,74	0,00%	100,00%	R\$	27.942,94	R\$	27.942,94						
5.3.5	SINAPI	95875	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M3XKM	6.282,60	-	6.282,60	0,00%	100,00%	R\$	18.596,49	R\$	18.596,49						
5.4	SINAPI	87899	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	24,37	-	24,37	0,00%	100,00%	R\$	78.133,91	R\$	78.133,91						
5.4.1	SINAPI	93358	URBANIZAÇÃO	M3	8,12	-	8,12	0,00%	100,00%	R\$	2.421,89	R\$	2.421,89						
5.4.2	SINAPI	96620	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	162,52	-	162,52	0,00%	100,00%	R\$	5.720,13	R\$	5.720,13						
5.4.3	SINAPI	CP-C0074-PMSLM	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M2	108,34	-	108,34	0,00%	100,00%	R\$	23.280,99	R\$	23.280,99						
5.4.4	SINAPI	87899	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	108,34	-	108,34	0,00%	100,00%	R\$	901,38	R\$	901,38						
5.4.5	SINAPI	87794	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	108,34	-	108,34	0,00%	100,00%	R\$	5.669,43	R\$	5.669,43						
5.4.6	SINAPI	94319	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M3	97,51	-	97,51	0,00%	100,00%	R\$	9.068,43	R\$	9.068,43						
5.4.7	SINAPI	94990	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	32,50	-	32,50	0,00%	100,00%	R\$	27.645,80	R\$	27.645,80						
5.4.8	SINAPI	104658	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	21,28	-	21,28	0,00%	100,00%	R\$	3.425,86	R\$	3.425,86						
5.5	SINAPI	CP-73916/002-PMSLM	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	UN	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$	21.650,81	R\$	21.650,81						
5.5.1	SINAPI	102498	SINALIZAÇÃO	M	711,70	-	711,70	0,00%	100,00%	R\$	222,86	R\$	222,86						
5.5.2	SINAPI	CP-40931-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M2	48,75	-	48,75	0,00%	100,00%	R\$	1.366,46	R\$	1.366,46						
5.5.3	SINAPI	97092	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	KG	151,59	-	151,59	0,00%	100,00%	R\$	16.220,10	R\$	16.220,10						
5.5.4	SINAPI	102509	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	48,75	-	48,75	0,00%	100,00%	R\$	2.433,01	R\$	2.433,01						
5.5.5	SINAPI	97956	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	M2	48,75	-	48,75	0,00%	100,00%	R\$	1.408,38	R\$	1.408,38						
5.6	SINAPI	92212	DRENAGEM	UN	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$	15.065,90	R\$	15.065,90						
5.6.1	SINAPI	92212	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2015	M	8,00	-	8,00	0,00%	100,00%	R\$	1.649,26	R\$	1.649,26						
5.6.2	SINAPI	102750	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$	2.514,24	R\$	2.514,24						
5.6.3	SINAPI	2003385	BOCA PARA BUJEO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$	3.080,93	R\$	3.080,93						
5.6.4	SINAPI	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	m	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$	65,54	R\$	65,54						
5.6.5	SINAPI	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$	567,03	R\$	567,03						

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
José Severino da Costa
Tecnólogo em Informática
CRM: 135081
Régis: 10110119

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$	128.456,81	% ADITADO	5,80%		
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO	0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	2.341.761,32	% TOTAL	5,80%		
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <th colspan="2">VALOR DO CONTRATO</th> <td>R\$</td> <td>2.213.304,51</td> <td>% ACUMULADO</td> <td>64,76%</td>			PROCESSO:		Nº 025/2023	VALOR DO CONTRATO		R\$	2.213.304,51	% ACUMULADO	64,76%		
PERÍODO:		02/02/2024 a 14/03/2024	ENDERECO:		SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	16.578,97	% DESTA EM				0,75%		
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SE NO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPLESA 05/2023 E COMPOSITORES DE CLUSTOS <td></td> <th colspan="2">EMPREENHIMENTO:</th> <td>Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)</td> <th colspan="2"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </th>			EMPREENHIMENTO:		Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
5.6.6	SINAPI	103930	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 912,53	0,49	-	-	0,49	0,00%	0,00%	0,49	R\$ 447,13	R\$	-	R\$ 447,13
5.6.7	Composições Próprias	COMP-19.04.0401-PMISM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 76,68	70,73	-	-	70,73	0,00%	0,00%	70,73	R\$ 5.423,57	R\$	-	R\$ 5.423,57
5.6.8	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 1.318,20	R\$	-	R\$ 1.318,20
6			RUA MANOEL REIS										R\$ 297.434,46	R\$	272.593,71	R\$ 24.840,72
6.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES										R\$ 2.301,28	R\$	283,00	R\$ 2.584,28
6.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMISM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	20,00	-	20,00	-	0,00%	100,00%	20,00	R\$ 283,00	R\$	-	R\$ 283,00
6.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMISM	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 30,96	20,00	-	20,00	-	0,00%	100,00%	20,00	R\$ 619,20	R\$	-	R\$ 619,20
6.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMISM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	12,00	-	12,00	-	0,00%	100,00%	12,00	R\$ 1.399,08	R\$	-	R\$ 1.399,08
6.2			MOVIMENTO DE TERRA													
6.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	600,96	-	600,60	0,36	0,00%	99,00%	600,60	R\$ 1.935,09	R\$	-	R\$ 1.935,09
6.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMISM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	150,24	-	150,15	0,09	0,00%	99,00%	150,15	R\$ 1.034,15	R\$	-	R\$ 1.034,15
6.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	901,44	-	900,90	0,54	0,00%	99,00%	900,90	R\$ 2.668,26	R\$	-	R\$ 2.668,26
6.3			PAVIMENTAÇÃO													
6.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	63,79	-	63,78	0,01	0,00%	99,00%	63,78	R\$ 12.899,61	R\$	-	R\$ 12.899,61
6.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	603,15	-	603,15	-	0,00%	100,00%	603,15	R\$ 62.721,56	R\$	-	R\$ 62.721,56
6.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	273,00	-	273,00	-	0,00%	100,00%	273,00	R\$ 19.519,50	R\$	-	R\$ 19.519,50
6.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMISM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 58,45	27,60	-	-	27,60	0,00%	0,00%	27,60	R\$ 1.613,22	R\$	-	R\$ 1.613,22
6.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	262,00	-	262,00	-	0,00%	100,00%	262,00	R\$ 13.513,96	R\$	-	R\$ 13.513,96
6.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	2.389,80	-	2.389,80	-	0,00%	100,00%	2.389,80	R\$ 7.073,80	R\$	-	R\$ 7.073,80
6.4			URBANIZAÇÃO													
6.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	10,40	-	8,21	2,19	0,00%	78,00%	8,21	R\$ 1.033,55	R\$	-	R\$ 1.033,55
6.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	3,46	-	1,03	2,43	0,00%	29,00%	1,03	R\$ 2.437,39	R\$	-	R\$ 2.437,39
6.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMISM	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	158,40	-	158,40	-	0,00%	100,00%	158,40	R\$ 22.690,80	R\$	-	R\$ 22.690,80
6.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	135,28	-	135,28	-	0,00%	100,00%	135,28	R\$ 1.125,52	R\$	-	R\$ 1.125,52
6.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	132,98	-	132,98	-	0,00%	100,00%	132,98	R\$ 6.958,84	R\$	-	R\$ 6.958,84
6.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	183,88	-	183,88	-	0,00%	100,00%	183,88	R\$ 17.100,84	R\$	-	R\$ 17.100,84
6.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 850,64	18,98	-	18,98	-	0,00%	100,00%	18,98	R\$ 16.145,14	R\$	-	R\$ 16.145,14
6.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	9,76	-	-	9,76	0,00%	0,00%	9,76	R\$ 1.571,26	R\$	-	R\$ 1.571,26

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$	% ADITADO		128.456,81	% SUPRIMIDO		0,00%	% TOTAL		5,80%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:												
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$										
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <th colspan="2">% ACUMULADO</th> <td>64,76%</td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td>			PROCESSO:		Nº 025/2023	% ACUMULADO		64,76%										
PERÍODO:		02/02/2024 a 14/03/2024	ENDERECO:		SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51	% DESTA EM		0,75%										
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESCRIBIDA, SE RD 07/2023 - NÃO DESCRIBADA, ONSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <td></td> <th colspan="2">EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <th colspan="2">MEDIDO NO PERÍODO:</th> <td>R\$ 16.578,97</td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> </th>			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <td></td> <th colspan="2">MEDIDO NO PERÍODO:</th> <td>R\$ 16.578,97</td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td> <th colspan="2"></th> <td></td>			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 16.578,97													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO											
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO							
6.4.9	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCX = 25 MPa. AF_11/2022	M3	4,09	-	4,09	100,00%	0,00%	R\$	12.261,00	R\$	12.261,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.294,80
6.5	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	SINALIZAÇÃO	UN	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$	222,86	R\$	222,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	222,86
6.5.1	SINAPI	102498	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	M	231,14	-	231,14	100,00%	0,00%	R\$	443,78	R\$	443,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	443,78
6.5.2	SINAPI	CP-40931-PMSLM	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M2	13,80	-	13,20	95,00%	0,00%	R\$	4.591,53	R\$	4.391,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	199,63
6.5.3	SINAPI	97092	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	KG	42,91	-	41,05	95,00%	0,00%	R\$	688,70	R\$	658,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,85
6.5.4	SINAPI	102509	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	M2	13,80	-	13,80	100,00%	0,00%	R\$	398,68	R\$	398,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	398,68
6.5.5	SINAPI	97996	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	UN	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	R\$	16.965,81	R\$	16.965,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.965,81
6.6	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	DRENAGEM	M	7,00	-	7,00	100,00%	0,00%	R\$	2.199,96	R\$	2.199,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.199,96
6.6.1	SINAPI	92212	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,1X1,2 M. AF_12/2020	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	R\$	65,54	R\$	65,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	65,54
6.6.2	SINAPI	2003385	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	3,00	-	3,00	100,00%	0,00%	R\$	567,03	R\$	567,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	567,03
6.6.3	SINAPI	103930	Entrada para descida d'água - ED-01 - areia e brita comerciais	M3	0,49	-	0,49	100,00%	0,00%	R\$	447,13	R\$	447,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	447,13
6.6.4	SINAPI	2003391	Bacia de dissipação, largura até 1 m, tipo bacia em pedra de mão fixada com concreto (DEB 01, 02), com preparo manual, FCX = 20 MPa, lançado manualmente, incluindo materiais e fôrmas (2 utilizações). AF_08/2022	M	111,40	-	111,40	100,00%	0,00%	R\$	8.542,15	R\$	8.542,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.542,15
6.6.5	SINAPI	99258	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	UN	7,00	-	7,00	100,00%	0,00%	R\$	1.845,48	R\$	1.845,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.845,48
6.6.6	SINAPI	93358	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	M3	42,05	-	42,05	100,00%	0,00%	R\$	67.517,33	R\$	66.056,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.460,80
6.6.7	SINAPI	96620	CONTENÇÃO	M3	2,90	-	2,90	100,00%	0,00%	R\$	4.178,92	R\$	4.178,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.178,92
6.6.8	SINAPI	103800	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	87,15	-	87,15	100,00%	0,00%	R\$	2.042,90	R\$	2.042,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.042,90
6.6.9	SINAPI	102724	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	120,00	-	120,00	100,00%	0,00%	R\$	49.870,71	R\$	49.870,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	49.870,71
6.6.10	SINAPI	95875	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	UN	36,52	-	36,52	66,00%	0,00%	R\$	4.382,40	R\$	4.382,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.382,40
6.6.11	SINAPI	95875	DRENO BARBAÇÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M3XKM	2,379,19	-	2,379,19	100,00%	0,00%	R\$	7.042,40	R\$	7.042,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.042,40
6.6.12	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,96	-	2,96	100,00%	0,00%	R\$	186.348,37	R\$	176.703,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.644,75
7	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	RUA PRFILA QUEIROZ MONTEIRO	m	20,00	-	20,00	100,00%	0,00%	R\$	2.301,28	R\$	2.301,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.301,28
7.1	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES	M2	20,00	-	20,00	100,00%	0,00%	R\$	283,00	R\$	283,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	283,00
7.1.1	SINAPI	100576	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M2	20,00	-	20,00	100,00%	0,00%	R\$	619,20	R\$	619,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	619,20
7.1.2	SINAPI	95875	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	UND	12,00	-	12,00	100,00%	0,00%	R\$	1.399,08	R\$	1.399,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.399,08
7.1.3	SINAPI	95875	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M2	650,61	-	650,61	99,00%	0,00%	R\$	6.104,30	R\$	6.092,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,03
7.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	MOVIMENTO DE TERRA	M³	162,65	-	162,65	100,00%	0,00%	R\$	1.120,65	R\$	1.120,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.120,65
7.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3,73	-	3,73	99,00%	0,00%	R\$	2.094,96	R\$	2.082,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,01
7.2.2	SINAPI	95875	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	162,65	-	162,65	100,00%	0,00%	R\$	1.120,65	R\$	1.120,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.120,65

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade Responsável ou Responsável Técnico
Civil (Educação nº 1873508-4)
Registro nº 1873508-4

BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$ 1.218.456,81		% ADITADO		5,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$ -		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.341.761,32		% TOTAL		5,80%	
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024		MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		64,76%	
PERÍODO:		02/02/2024		ENDEREÇO:		SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 16.578,97		% DESTES BIM		R\$ -		% DESTE BIM		0,75%	
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SCRIO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS <th colspan="2">EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <th colspan="2">UNID.</th> <th colspan="2">PREÇO UNITÁRIO</th> <th colspan="2">BDI</th> <th colspan="2">20,97%</th> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <th colspan="2"></th> </th>		EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) <th colspan="2">UNID.</th> <th colspan="2">PREÇO UNITÁRIO</th> <th colspan="2">BDI</th> <th colspan="2">20,97%</th> <th colspan="2">QUANTITATIVO</th> <th colspan="2">FÍSICO</th> <th colspan="2">FINANCEIRO</th> <th colspan="2"></th>		UNID.		PREÇO UNITÁRIO		BDI		20,97%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
7.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	975,91	-	975,90	0,01	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.888,69	R\$ -	R\$ 2.888,66	R\$ 0,02			
7.3	SINAPI	96396	PAVIMENTAÇÃO	M3	R\$ 202,22	69,11	-	69,04	0,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 11.524,16	R\$ -	R\$ 11.608,92	R\$ 915,22			
7.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	R\$ 103,99	575,97	-	575,97	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 59.895,12	R\$ -	R\$ 59.895,12	R\$ -			
7.3.2	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	M	R\$ 71,50	248,80	-	248,80	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 17.789,20	R\$ -	R\$ 17.789,20	R\$ -			
7.3.3	SINAPI	CP-50262-PMSLM	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	R\$ 58,45	32,41	-	17,10	15,31	0,00%	52,00%	47,00%	R\$ 1.894,36	R\$ -	R\$ 999,49	R\$ 894,86			
7.3.4	SINAPI	94287	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRAÇO 1:3	M	R\$ 51,58	248,80	-	248,80	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 12.833,10	R\$ -	R\$ 12.833,10	R\$ -			
7.3.5	SINAPI	95875	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M3XKM	R\$ 2,96	2.073,30	-	2.071,20	2,10	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 6.136,96	R\$ -	R\$ 6.130,75	R\$ 6,21			
7.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	2.073,30	-	2.071,20	2,10	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 6.136,96	R\$ -	R\$ 6.130,75	R\$ 6,21			
7.4.1	SINAPI	93358	URBANIZAÇÃO	M3	R\$ 99,38	11,18	-	11,18	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 41.727,73	R\$ -	R\$ 36.870,78	R\$ 4.856,94			
7.4.2	SINAPI	96620	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 704,45	3,72	-	1,40	2,32	0,00%	37,00%	62,00%	R\$ 1.111,06	R\$ -	R\$ 1.111,06	R\$ -			
7.4.3	SINAPI	CP-0074-PMSLM	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M2	R\$ 143,25	74,64	-	74,56	0,08	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.620,55	R\$ -	R\$ 986,23	R\$ 1.634,32			
7.4.4	SINAPI	87893	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 8,32	49,76	-	49,69	0,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 10.692,18	R\$ -	R\$ 10.680,72	R\$ 11,46			
7.4.5	SINAPI	87794	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 52,33	49,76	-	49,69	0,07	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ 413,42	R\$ 0,58			
7.4.6	SINAPI	94319	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 93,00	55,98	-	55,98	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.603,94	R\$ -	R\$ 2.600,27	R\$ 3,66			
7.4.7	SINAPI	94990	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 850,64	18,66	-	18,66	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.206,14	R\$ -	R\$ 5.206,14	R\$ -			
7.4.8	SINAPI	104658	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 160,99	19,92	-	19,92	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 15.872,94	R\$ -	R\$ 15.872,94	R\$ -			
7.5	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	19,92	-	19,92	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 3.206,92	R\$ -	R\$ 3.206,92	R\$ -			
7.5.1	SINAPI	CP-73916/002-PMSLM	SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.911,32	R\$ -	R\$ 5.050,75	R\$ 3.860,56			
7.5.2	SINAPI	102498	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 43X25CM	M	R\$ 1,92	248,80	-	248,80	-	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86	R\$ -			
7.5.3	SINAPI	CP-103701-PMSLM	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M2	R\$ 720,18	2,57	-	2,57	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 477,69	R\$ -	R\$ 477,69	R\$ -			
7.5.4	SINAPI	109694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022	UN	R\$ 107,38	6,00	-	6,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.850,86	R\$ -	R\$ 1.850,86	R\$ -			
7.5.5	SINAPI	CP-40931-PMSLM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	M2	R\$ 332,72	13,89	-	13,20	0,69	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ 644,28	R\$ -	R\$ 644,28	R\$ -			
7.5.6	SINAPI	97092	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	KG	R\$ 16,05	43,17	-	41,05	2,12	0,00%	95,00%	4,00%	R\$ 4.621,48	R\$ -	R\$ 4.391,90	R\$ 229,57			
7.5.7	SINAPI	102509	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	M2	R\$ 28,89	13,89	-	13,89	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 692,87	R\$ -	R\$ 692,87	R\$ -			
7.6	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 76,68	161,80	-	161,80	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ 401,28	R\$ -			
7.6.1	SINAPI	COMP-19.04.040-PMSLM	DRENAGEM	M	R\$ 263,64	9,00	-	9,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.779,58	R\$ -	R\$ 14.779,58	R\$ -			
7.6.2	SINAPI	99258	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDADOS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	9,00	-	9,00	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.406,82	R\$ -	R\$ 12.406,82	R\$ -			

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

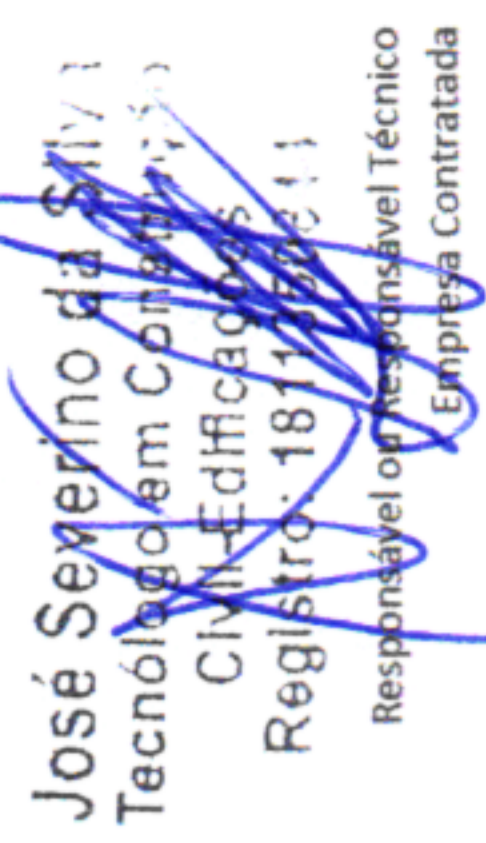
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
Civil - Edifício Responsável ou Responsável Técnico
Registro: 181613657-3 Empresa Contratada

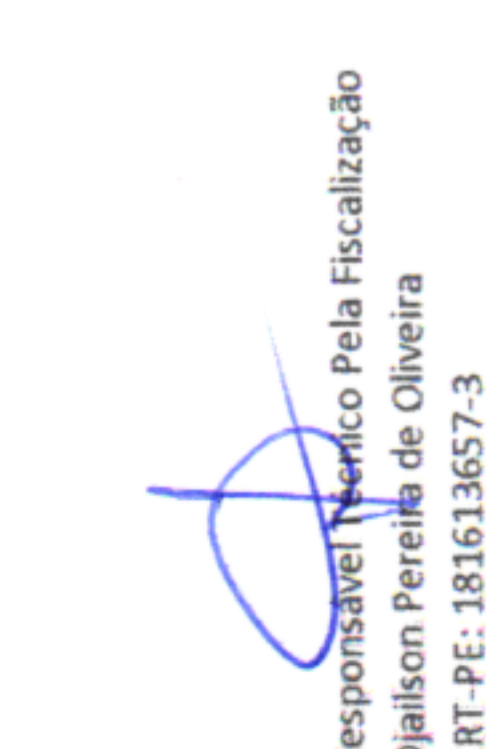


BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$	128.456,81	% ADITADO	5,80%				
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO	0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	2.341.761,32	% TOTAL	5,80%				
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	PROCESSO:		Nº 025/2023										
PERÍODO:		02/02/2024	VALOR DO CONTRATO:		R\$	2.213.304,51	% ACUMULADO			64,76%					
		14/03/2024	MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	16.578,97	% DESTA BM			0,75%					
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SKRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPEISA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
				UNID.		PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
8			RUA SOUTO MAIOR JÚNIOR												
8.1			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
8.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	9,58	0,00%	9,55	0,03	0,00%	R\$ 135,55	R\$ 135,55	0,00%	R\$ 135,55	R\$ 0,42
8.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 30,96	14,36	0,00%	14,33	0,03	0,00%	R\$ 444,58	R\$ 444,58	0,00%	R\$ 444,58	R\$ 0,92
8.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	14,00	0,00%	14,00	-	0,00%	R\$ 1.632,26	R\$ 1.632,26	0,00%	R\$ 1.632,26	R\$ -
8.2			MOVIMENTO DE TERRA												
8.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	422,04	0,00%	422,04	-	0,00%	R\$ 1.358,96	R\$ 1.358,96	0,00%	R\$ 1.358,96	R\$ -
8.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	105,51	0,00%	105,51	-	0,00%	R\$ 726,96	R\$ 726,96	0,00%	R\$ 726,96	R\$ -
8.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	633,06	0,00%	633,06	-	0,00%	R\$ 1.873,85	R\$ 1.873,85	0,00%	R\$ 1.873,85	R\$ -
8.3			PAVIMENTAÇÃO												
8.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	43,10	0,00%	43,10	-	0,00%	R\$ 8.715,68	R\$ 8.715,68	0,00%	R\$ 8.715,68	R\$ -
8.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	342,23	0,00%	342,23	-	0,00%	R\$ 35.588,49	R\$ 35.588,49	0,00%	R\$ 35.588,49	R\$ -
8.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	209,08	0,00%	200,00	9,08	0,00%	R\$ 14.949,22	R\$ 14.949,22	0,00%	R\$ 14.949,22	R\$ 649,22
8.3.4	Composições Próprias	CP-502622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 58,45	10,00	0,00%	-	10,00	0,00%	R\$ 584,50	R\$ 584,50	0,00%	R\$ 584,50	R\$ -
8.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	209,08	0,00%	-	209,08	0,00%	R\$ 10.784,34	R\$ 10.784,34	0,00%	R\$ 10.784,34	R\$ -
8.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	1.293,00	0,00%	1.293,00	-	0,00%	R\$ 3.827,28	R\$ 3.827,28	0,00%	R\$ 3.827,28	R\$ -
8.3.7	SINAPI	101832	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$ 95,03	19,40	0,00%	-	19,40	0,00%	R\$ 1.843,58	R\$ 1.843,58	0,00%	R\$ 1.843,58	R\$ -
8.4			URBANIZAÇÃO												
8.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	9,40	0,00%	-	9,40	0,00%	R\$ 934,17	R\$ 934,17	0,00%	R\$ 934,17	R\$ -
8.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	3,12	0,00%	-	3,12	0,00%	R\$ 2.197,88	R\$ 2.197,88	0,00%	R\$ 2.197,88	R\$ -
8.4.3	Composições Próprias	CP-00074-PMSLM	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	62,72	0,00%	-	62,72	0,00%	R\$ 8.984,64	R\$ 8.984,64	0,00%	R\$ 8.984,64	R\$ -
8.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	41,80	0,00%	-	41,80	0,00%	R\$ 347,77	R\$ 347,77	0,00%	R\$ 347,77	R\$ -
8.4.5	SINAPI	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	41,80	0,00%	-	41,80	0,00%	R\$ 2.187,39	R\$ 2.187,39	0,00%	R\$ 2.187,39	R\$ -
8.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	31,36	0,00%	30,00	1,36	0,00%	R\$ 2.916,48	R\$ 2.916,48	0,00%	R\$ 2.916,48	R\$ 126,48
8.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 850,64	10,44	0,00%	-	10,44	0,00%	R\$ 8.850,68	R\$ 8.850,68	0,00%	R\$ 8.850,68	R\$ -
8.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	13,28	0,00%	-	13,28	0,00%	R\$ 2.137,94	R\$ 2.137,94	0,00%	R\$ 2.137,94	R\$ -


 José Severino da Silva
 Tecnólogo em Computação
 Civil-Edificações
 Registro: 18113657-1
 Responsável Técnico
 Empresa Contratada

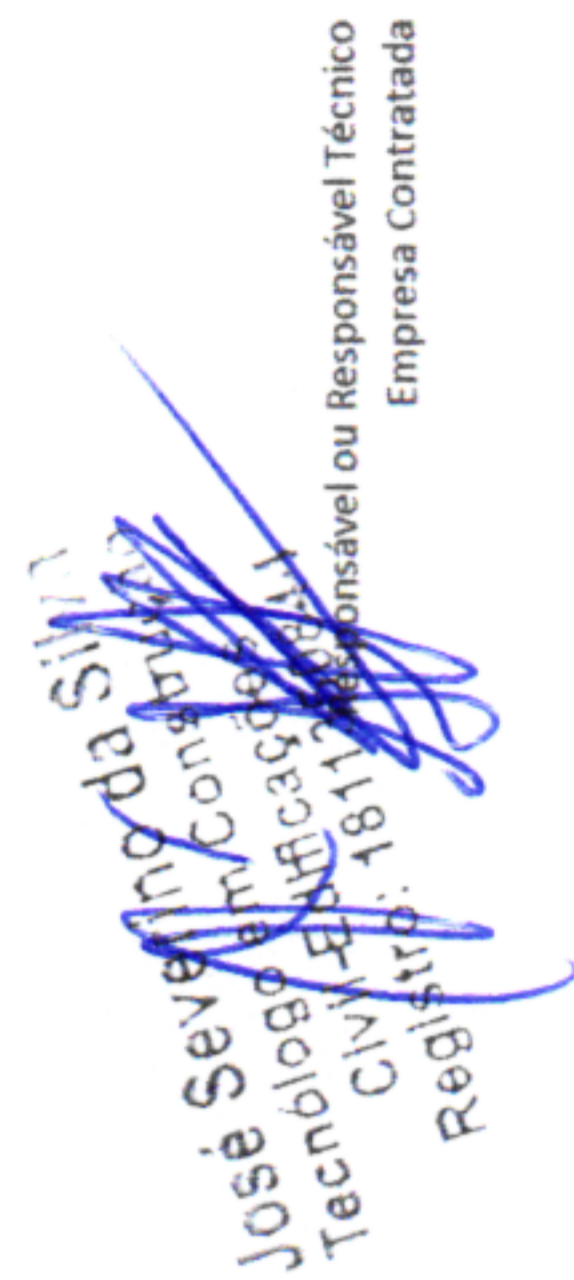

 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz


 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$		128.456,81		% ADITADO		5,80%	
TERMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		0,00%		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		2.341.761,32		% TOTAL		5,80%	
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		% ACUMULADO		R\$		64,76%					
PERÍODO:		02/02/2024		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% DESTES BIM		R\$		16.578,97					
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPOSIÇÕES 05/2013 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		20,97%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO					
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO			
8.5	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	SINALIZAÇÃO																
8.5.1	SINAPI	102498	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	-	-	R\$ 222,86			
8.5.2	SINAPI	CP-40931-Próprias	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	209,08	-	-	209,08	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 401,43	-	-	R\$ 401,43			
8.5.3	SINAPI	97092	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	10,20	-	-	10,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.393,74	-	-	R\$ 3.393,74			
8.5.4	SINAPI	102509	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	31,70	-	-	31,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 508,78	-	-	R\$ 508,78			
8.5.5	SINAPI	97956	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	10,20	-	-	10,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 294,67	-	-	R\$ 294,67			
8.6	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	DRENAGEM																
8.6.1	SINAPI	92212	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 76,68	35,37	-	-	35,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.712,17	-	-	R\$ 2.712,17			
8.6.2	SINAPI	98258	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,28	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,40	-	-	R\$ 1.571,40			
8.6.3	SINAPI	97956	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,40x0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 790,92	-	-	R\$ 790,92			
8.6.4	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.649,26	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.298,52	-	-	R\$ 3.298,52			
8.7	Composições Próprias	93358	CONTENÇÃO																
8.7.1	SINAPI	96620	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	75,14	-	-	75,14	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.467,41	-	-	R\$ 7.467,41			
8.7.2	SINAPI	103800	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	6,52	-	-	6,52	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.593,01	-	-	R\$ 4.593,01			
8.7.3	SINAPI	102724	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 572,24	159,96	-	-	159,96	0,00%	0,00%	46,00%	R\$ 91.535,51	-	-	R\$ 48.606,06			
8.7.4	SINAPI	95875	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 36,52	206,00	-	-	206,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7.523,12	-	-	R\$ 7.523,12			
8.7.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	4.366,90	-	-	4.366,90	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.926,02	-	-	R\$ 12.926,02			
9	Composições Próprias	CP-500021-PMSLM	TRECHO DA RUA JOÃO BEZERRA DA SILVA																
9.1	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES																
9.1.1	SINAPI	100576	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 14,15	15,00	-	-	15,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 212,25	-	-	R\$ 212,25			
9.1.2	SINAPI	95875	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 30,96	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 309,60	-	-	R\$ 309,60			
9.1.3	SINAPI	95875	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 116,59	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 582,95	-	-	R\$ 582,95			
9.2	Composições Próprias	CP-19.07.380-PMSLM	MOVIMENTO DE TERRA																
9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,22	465,00	-	-	465,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.497,30	-	-	R\$ 1.497,30			
9.2.2	SINAPI	95875	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 6,89	116,25	-	-	116,25	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 800,96	-	-	R\$ 800,96			
9.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	697,50	-	-	697,50	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.064,60	-	-	R\$ 2.064,60			
9.3	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	PAVIMENTAÇÃO																
9.3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	49,10	-	-	49,10	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.929,00	-	-	R\$ 9.929,00			
9.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 103,99	409,20	-	-	374,00	0,00%	0,00%	8,00%	R\$ 42.552,70	-	-	R\$ 38.892,26			


 José Severina
 Técnico de Infraestrutura
 Civil - Matr. 1811811
 Registro: 1811811

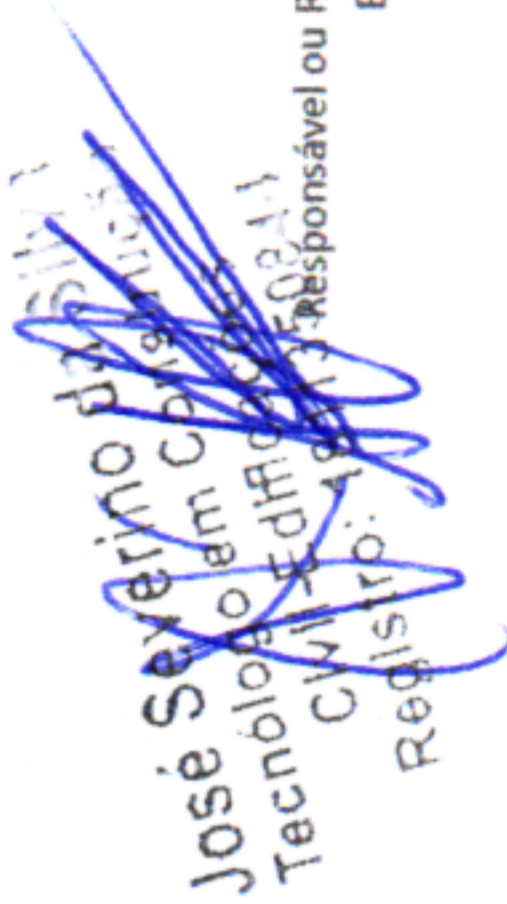
Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3




BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023	MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	ADITIVO DE VALOR:		R\$ 128.456,81	% ADITADO		5,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024	PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:			% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS	GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:		Nº 032/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.341.763,32	% TOTAL		5,80%	
DATA DE EMISSÃO:		14/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE <td></td> <th colspan="2">PROCESSO:</th> <td>Nº 025/2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			PROCESSO:		Nº 025/2023							
PERÍODO:		02/02/2024		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO								
		14/03/2024		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 16.578,97		% DESTA BM								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA
9.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	186,00	-	186,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 13.299,00	R\$ -	R\$ 13.299,00	R\$ -
9.3.4	Composições Próprias	CP-S0262-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3	M	R\$ 58,45	26,40	-	26,40	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.543,08	R\$ -	R\$ 1.543,08	R\$ -
9.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	186,00	-	186,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.593,88	R\$ -	R\$ 9.593,88	R\$ -
9.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	1.473,00	-	1.473,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.360,08	R\$ -	R\$ 4.360,08	R\$ -
9.4			URBANIZAÇÃO												
9.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 99,38	8,36	-	4,41	52,00%	0,00%	0,00%	R\$ 830,81	R\$ -	R\$ 830,81	R\$ -
9.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	2,78	-	1,48	53,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.958,37	R\$ -	R\$ 1.958,37	R\$ -
9.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	55,80	-	55,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.993,35	R\$ -	R\$ 7.993,35	R\$ -
9.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	37,20	-	37,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 309,50	R\$ -	R\$ 309,50	R\$ -
9.4.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	37,20	-	37,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.946,67	R\$ -	R\$ 1.946,67	R\$ -
9.4.6	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	33,48	-	33,48	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.113,64	R\$ -	R\$ 3.113,64	R\$ -
9.4.7	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	M3	R\$ 850,64	13,94	-	8,79	63,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.857,92	R\$ -	R\$ 11.857,92	R\$ -
9.4.8	SINAPI	104658	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 160,99	9,76	-	9,76	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.571,26	R\$ -	R\$ 1.571,26	R\$ -
9.5			SINALIZAÇÃO												
9.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ 222,86	R\$ -
9.5.2	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	186,00	-	186,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 357,12	R\$ -	R\$ 357,12	R\$ -
9.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	13,20	-	13,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.391,90	R\$ -	R\$ 4.391,90	R\$ -
9.5.4	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	R\$ 16,05	41,04	-	41,04	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 658,69	R\$ -	R\$ 658,69	R\$ -
9.5.5	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 28,89	13,20	-	13,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 381,34	R\$ -	R\$ 381,34	R\$ -
9.6			DRENAGEM												
9.6.1	SINAPI	97996	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.649,26	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.298,52	R\$ -	R\$ 3.298,52	R\$ -
9.6.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,28	7,00	-	7,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.199,96	R\$ -	R\$ 2.199,96	R\$ -
9.6.3	SICRO NOVO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ 65,54	R\$ -
9.6.4	SICRO NOVO	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 189,01	3,00	-	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 567,03	R\$ -	R\$ 567,03	R\$ -
9.6.5	SINAPI	103930	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCX = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 912,53	0,49	-	0,49	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 447,13	R\$ -	R\$ 447,13	R\$ -
9.6.6	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	R\$ 263,64	9,00	-	9,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.372,76	R\$ -	R\$ 2.372,76	R\$ -
9.6.7	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 76,68	110,37	-	109,00	98,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.463,17	R\$ -	R\$ 8.358,12	R\$ 105,05


 José Severino da Silva
 Responsável Técnico
 Tecnologia em Obras
 CMA Edifício 0211
 Registro: 12117


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz


 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

